


# Note

Titre : point déploiement de la fibre optique au 05/09/2019

Schéma de déploiement de la fibre

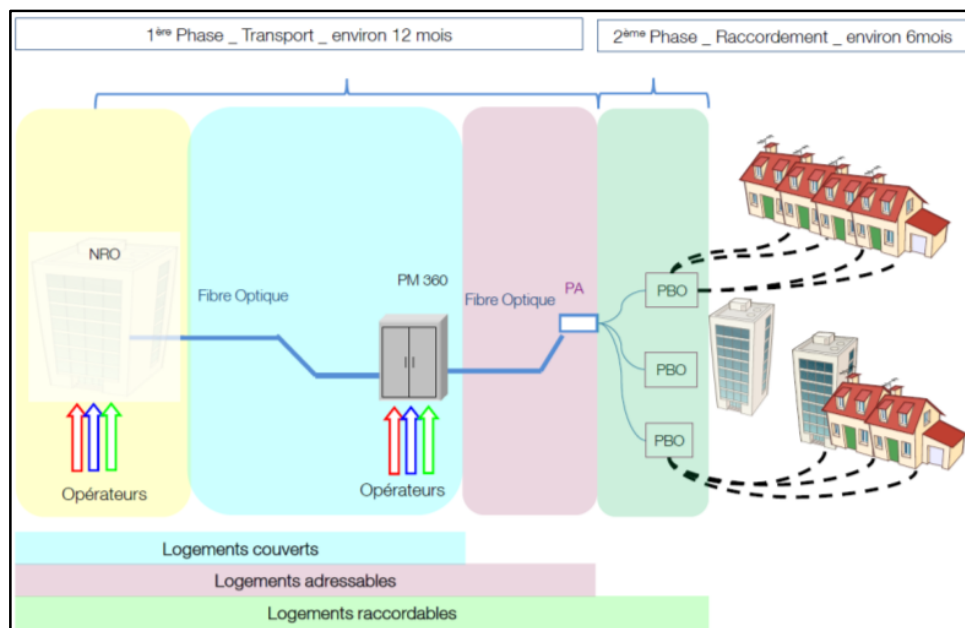

Les chiffres de déploiement depuis fin 2018 (*détail par commune en annexe 1*)

Equivalent logements base INSEE 2015 :	Adressables (Armoire posée et point d'aboutement)					
	06/11/2018		08/05/2019		22/07/2019	
63 340	Nb prises	%	Nb prises	%	Nb prises	%
	23 202	36 %	36 192	57 %	44 230	70%
Equivalent logements base INSEE 2015 :	Raccordables (le client est éligible)					
	06/11/2018		08/05/2019		22/07/2019	
63 340	Nb prises	%	Nb prises	%	Nb prises	%
	14 451	23%	16 756	26%	18 493	29%

A fin juillet 2019, l'état du déploiement sur l'agglomération est le suivant, sur un objectif de près de 63 500 logements :

- 44 230 locaux sont adressables ce qui représente une progression de plus de 90% depuis le début de l'année
- 18 493 locaux sont raccordables avec une progression de près de 17% depuis le début de l'année.

Ces chiffres mettent en avant :

- L'accélération du déploiement sur l'adressable :
  - o La phase de transport est en cours pour toutes les communes de l'agglomération ; cette phase consiste à déployer la fibre entre les 7 NRO du territoire et les différentes armoires prévues pour chaque commune.
- Une progression plus mesurée de locaux raccordables. Les équipes de sous-traitance ont été mobilisées pour le lancement du déploiement sur toutes les communes de l'agglomération ce qui explique en partie la progression plus mesurée sur le raccordable.

### Point d'avancement par communes

Les 13 et 14 mai dernier, deux réunions ont été proposées à l'ensemble des communes qui n'étaient pas concernées par les lots 1, 2 et 3, préalablement au lancement des travaux. Ces réunions ont été l'occasion de rappeler la disparition du découpage par lot : **Toutes les communes sont aujourd'hui concernées par le déploiement de la fibre.**

Ces réunions ont permis de donner de la visibilité aux communes tant sur les déploiements à venir (*Cf. annexe 2 : planning prévisionnel des armoires remis au cours de ces réunions*) mais également de les informer sur les points de vigilance permettant de faciliter les déploiements avec notamment :

- Le suivi des travaux d'élagage,
- Le suivi et la réactivité sur les demandes d'autorisations de voiries,
- Le suivi des conventions d'immeubles,
- Le suivi des travaux (sécurité),
- Les travaux d'enfouissement (les communes doivent faire remonter leurs éventuels projets),
- La communication auprès de la population.

Trois mois après ces deux réunions :

- les armoires ont été posées pour les communes de Saint-Benoit-des-Ondes, Miniac-Morvan, la Fresnais et Saint-Suliac.
- Des travaux de Génie-civil ont été réalisés entre le NRO de la Gouesnière et les communes de Saint-Guinoux et Saint-Père permettant de finaliser les travaux de transport pour ces deux communes.
- La pose des armoires est programmée pour les autres communes (*Cf. point d'étape par commune en annexe 3*).

Au regard du planning annoncé en mai dernier, Orange est en décalage de planning sur 4 communes (Saint-Jouan-des-Guérets, la Ville-Es-Nonais, Saint-Guinoux et Saint-Père, des explications seront demandées auprès d'Orange lors du prochain point technique prévu courant septembre.

## Annexe 1 : Point déploiement - chiffres de déploiement à fin Juillet

Localité	Equivalent logements CSPD2019	Adressables au 8/5/19	Adressables au 18/6/19	Adressables au 22/7/19	Taux adressables	Raccordables au 8/5/2019	Raccordables au 18/6/2019	Raccordables au 22/7/2019	Taux Raccordables
Cancale	5 092	2556	2560	4061	80%	1361	1382	1392	27%
Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine	875				0%				0%
Hirel	927				0%				0%
La Fresnais	1 304				0%				0%
La Gouesnière	903	934	932	946	105%	429	443	531	59%
La Ville-Es-Nonais	667				0%				0%
Le Tronchet	739				0%				0%
Lillemer	179				0%				0%
Miniac-Morvan	2 150				0%				0%
Plerguer	1 363				0%				0%
Saint-Benoît-des-Ondes	680				0%				0%
St-Coulomb	1 939	1271	1273	1312	68%	836	842	848	44%
St-Guinoux	564	38	38	38	7%				0%
St-Jouan-des-Guérets	1 567	81	82	82	5%	12	43	43	3%
St-Malo	40 108	29125	34401	35681	89%	13160	13787	14648	37%
St-Méloir-des-Ondes	2 455	2087	2056	2110	86%	958	967	1031	42%
Saint-Père	1 156				0%				0%
Saint-Suliac	671				0%				0%
<b>Total général</b>	<b>63340</b>	<b>36092</b>	<b>41342</b>	<b>44230</b>	<b>70%</b>	<b>16756</b>	<b>17464</b>	<b>18493</b>	<b>29%</b>



### Annexe 3 : point par commune au 05/09/2019

Communes	Etat d'avancement au 03/09/2019	Point de vigilance
Saint Benoit des Ondes	Armoires posées Phase de transport terminée (fibre déployée entre le NRO et les armoires)	
Saint Jouan des Guérets	Armoires non posées Phase de transport terminée	Retard par rapport au planning annoncé en mai
La Ville Es Nonais	Armoires non posées Phase de transport terminée	Retard par rapport au planning annoncé en mai
Miniac Morvan	Armoires posées Phase de transport terminée	
Châteauneuf-d'Ille-Et-Vilaine	Armoires non posées Phase de transport en cours	Prévisionnel : Sept
La Fresnais	Armoires posées Phase de transport terminée	
Le Tronchet	Armoires non posées Transport non réalisé	Prévisionnel : Oct
Hirel	Armoires non posées Phase de transport non réalisée	Prévisionnel : Sept
Plerguer	Armoires non posées Phase de transport non réalisée	Prévisionnel : Sept
La Gouesnière	Armoires posées Phase de transport terminée	
Saint Père	Travaux de Génie Civil réalisés pour transport	Retard par rapport au planning annoncé en mai sur la pose des armoires
Saint Guinoux	Travaux de Génie Civil réalisés pour transport	
Saint Suliac	Armoires posées Phase de transport réalisée	
Lillemer	Travaux de Génie Civil pour la phase de transport prévu en sept/oct.	Prévisionnel : Sept
Saint Malo	Toutes les armoires sont posées sauf intra-muros (prévu pour oct.) Depuis début 2019, 52 armoires ont été posées.	
Saint Coulomb	Armoires posées Phase de transport terminée	
Cancale	Armoires posées Phase de transport terminée	
